

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



**DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC**

Affaire suivie par Roxanne DURAND  
☎ 01 30 87 23 15 - 📠 01 30 87 20 96  
✉ espacepublic@saintgermainenlaye.fr

COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  
16 RUE DE PONTOISE BP10101  
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Saint-Germain-en-Laye, le 21 février 2024

Objet : Vérification conformité de raccordement à l'égout  
Pièces jointes : rapport de contrôle  
Affaire : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Madame Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, les informations concernant la vérification de la conformité du raccordement à l'égout de la propriété située 16 RUE DE LA SALLE 4 LOGEMENTS - SECTION AI - PARCELLE 412 - LOT 9 (RDC), LOT 2 (1ER), LOT 3 (2EME), LOT 4 (3EME) à Saint-Germain-en-Laye.

Les raccordements au réseau communal d'assainissement sont conformes.

Seul le rejet des eaux usées du présent appartement a été vérifié.

Je tiens à vous informer qu'un titre de recettes va vous parvenir de la part de la Trésorerie d'un montant de 1024,0 € conformément aux droits de voirie délibérés en Conseil Communautaire du 24 mars 2022.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire, Madame Monsieur, à l'assurance de mes sincères salutations.

**Pour le Maire et par délégation,  
La Maire-Adjointe déléguée à la Voirie,  
aux Réseaux et à la Mobilité**

**Elisabeth GUYARD**

[www.saintgermainenlaye.fr](http://www.saintgermainenlaye.fr)

Hôtel de Ville : 16, rue de Pontoise – Centre Administratif : 86/88, rue Léon Désoyer – Standard : 01 30 87 20 00  
Adresse postale : BP 10 101 – 78101 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Cedex



N° Dossier :

E.24.326

JW / NV

Nombre de pages : 3

**OBJECTIF : Contrôle du raccordement et établissement d'un rapport**



**CLIENT :**

**MAIRIE**

Propriétaire :

MAIRIE

Interlocuteur sur site :

-

Adresse :

16 RUE DE LA SALLE

VILLE :

SAINT GERMAIN EN LAYE

TYPE DE BIEN :

APPARTEMENT : Rdc Lot 9

Réseau de collecte :

UNITAIRE

Date du contrôle : 09/02/2024

**Détail des essais réalisés**

**Raccordé au réseau public**

**Autre**

**Evacuation indéterminée**

Installation testée

Moyen

eaux usées

eaux pluviales

unitaire

Cuisine (Rdc)

Colorant

X

WC (Rdc)

Colorant

X

Salle d'eau (1er) [Douche/Lavabo]

Colorant

X

**RESULTATS**

EAUX USEES testées RACCORDEES au réseau d'eaux unitaire :

Oui

RESPECT DE LA SEPARATIVITE jusqu'en limite de propriété :

Non testé sur les appartements

Observations :

Rédigé le :

14/02/2024

Vérfifié le :


Visa : N.VAZ

Visa :

*Il n'appartient pas à la société EAV de statuer sur la conformité des installations contrôlées. La société EAV ne se tient pas pour responsable du raccordement des installations (WC, cuisine, salle de bains, évier et autres ...) non présentées lors du contrôle.*

*Les informations présentes dans ce rapport sont strictement confidentielles et demeurent la propriété du client.*

*Ce document ne peut être reproduit sans l'accord de EAV et du client.*

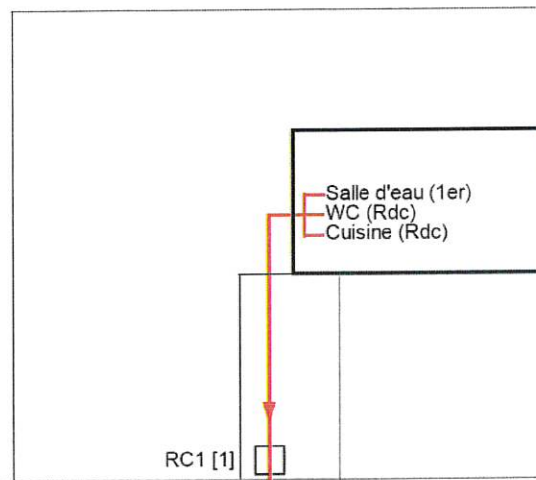

N°16

RUN1 [1]

Rue de la Salle

Schéma sans échelle  
Le tracé des réseaux est supposé

Légende

— Réseau Eaux Usées  
- - - Réseau Unitaire

□ RUNx - Regard Unitaire  
□ RCx - Regard de contrôle

➔ Sens d'écoulement  
[x] Nombre de photos prises

Client :

**MAIRIE**

Adresse :

16 RUE DE LA SALLE

Ville :

SAINT GERMAIN EN LAYE

Opérateur : **JW**

Réseau : **UNITAIRE**

Page n°3 / 3

Date : **09/02/2024**

Dossier n° **E.24.326**

**PHOTOS ET OBSERVATIONS**



RC1 : Résurgence de colorant dans RC1 lors des essais sur les installations eaux usées de l'appartement



RUN1 : Résurgence de colorant dans RUN1 lors des essais sur les installations eaux usées de l'appartement



N° Dossier :

E.24.399

JW / NV

Nombre de pages : 3

**OBJECTIF : Contrôle du raccordement et établissement d'un rapport**



**CLIENT :**

**MAIRIE**

Propriétaire :

MAIRIE

Interlocuteur sur site :

-

Adresse :

16 RUE DE LA SALLE

VILLE :

SAINT GERMAIN EN LAYE

TYPE DE BIEN :

APPARTEMENT : 1er Lot 2

Réseau de collecte :

UNITAIRE

Date du contrôle : 09/02/2024

**Détail des essais réalisés**

**Raccordé au réseau public**

**Autre**

**Evacuation indéterminée**

Installation testée

Moyen

eaux usées

eaux pluviales

unitaire

Salle d'eau (1er) [Douche/Lavabo/WC]

Colorant

X

Cuisine (1er) [Evier/Lave-linge]

Colorant

X

**RESULTATS**

EAUX USEES testées RACCORDEES au réseau d'eaux unitaire :

Oui

RESPECT DE LA SEPARATIVITE jusqu'en limite de propriété :

Non testé sur les appartements

Observations :

Rédigé le :

14/02/2024

Vérifié le :

Visa : N.VAZ

Visa :

*Il n'appartient pas à la société EAV de statuer sur la conformité des installations contrôlées. La société EAV ne se tient pas pour responsable du raccordement des installations (WC, cuisine, salle de bains, éviers et autres ...) non présentées lors du contrôle.*

*Les informations présentes dans ce rapport sont strictement confidentielles et demeurent la propriété du client.*

*Ce document ne peut être reproduit sans l'accord de EAV et du client.*

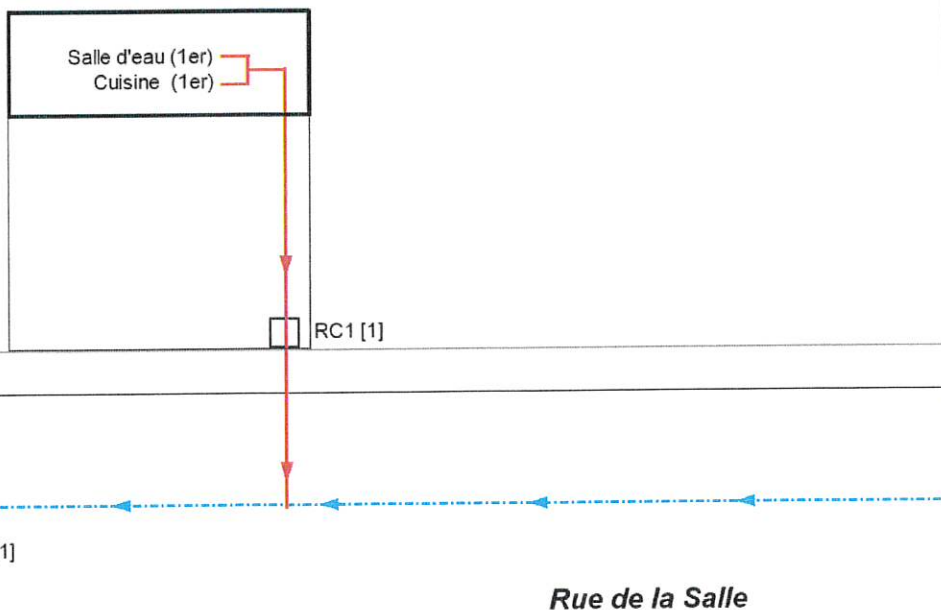


Schéma sans échelle  
Le tracé des réseaux est supposé

Légende

— Réseau Eaux Usées  
- - - Réseau Unitaire

□ RUNx - Regard Unitaire  
□ RCx - Regard de contrôle

→ Sens d'écoulement  
[x] Nombre de photos prises



Client :

**MAIRIE**

Adresse :

16 RUE DE LA SALLE

Ville :

SAINT GERMAIN EN LAYE

Opérateur : **JW**

Réseau : **UNITAIRE**

Page n°3 / 3

Date : **09/02/2024**

Dossier n° **E.24.399**

**PHOTOS ET OBSERVATIONS**



RC1 : Résurgence de colorant dans RC1 lors des essais sur les installations eaux usées de l'appartement



RUN1 : Résurgence de colorant dans RUN1 lors des essais sur les installations eaux usées de l'appartement



N° Dossier :

E.24.400

JW / NV

Nombre de pages : 3

**OBJECTIF : Contrôle du raccordement et établissement d'un rapport**



**CLIENT :**

**MAIRIE**

Propriétaire :

MAIRIE

Interlocuteur sur site :

-

Adresse :

16 RUE DE LA SALLE

VILLE :

SAINT GERMAIN EN LAYE

TYPE DE BIEN :

APPARTEMENT : 2ème Lot 3

Réseau de collecte :

UNITAIRE

Date du contrôle : 09/02/2024

**Détail des essais réalisés**

**Raccordé au réseau public**

**Autre**

**Evacuation  
indéterminée**

**Installation testée**

**Moyen**

eaux usées

eaux  
pluviales

unitaire

Salle d'eau (2ème) [Douche/Lavabo/WC]

Colorant

X

Cuisine (2ème) [Evier/Lave-linge]

Colorant

X

**RESULTATS**

EAUX USEES testées RACCORDEES au  
réseau d'eaux unitaire :

Oui

RESPECT DE LA  
SEPARATIVITE jusqu'en  
limite de propriété :

Non testé sur  
les  
appartements

Observations :

Rédigé le :

14/02/2024

Vérfié le :


Visa : N.VAZ

Visa :

*Il n'appartient pas à la société EAV de statuer sur la conformité des installations contrôlées. La société EAV ne se tient pas pour responsable du raccordement des installations (WC, cuisine, salle de bains, éviers et autres ...) non présentées lors du contrôle.*

*Les informations présentes dans ce rapport sont strictement confidentielles et demeurent la propriété du client.*

*Ce document ne peut être reproduit sans l'accord de EAV et du client.*

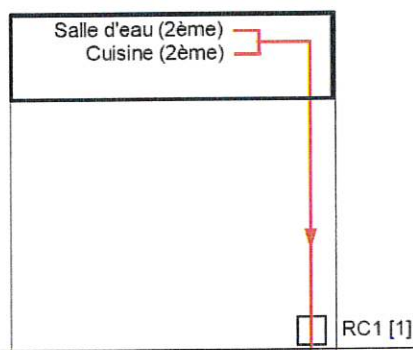

N°16



Rue de la Salle

Schéma sans échelle  
Le tracé des réseaux est supposé

Légende

— Réseau Eaux Usées  
- - - Réseau Unitaire

□ RUNx - Regard Unitaire  
□ RCx - Regard de contrôle

➔ Sens d'écoulement  
[x] Nombre de photos prises

Client :

**MAIRIE**

Adresse :

16 RUE DE LA SALLE

Ville :

SAINT GERMAIN EN LAYE

Opérateur : **JW**

Réseau : **UNITAIRE**

Page n°3 / 3

Date : **09/02/2024**

Dossier n° **E.24.400**

**PHOTOS ET OBSERVATIONS**



RC1 : Résurgence de colorant dans RC1 lors des essais sur les installations eaux usées de l'appartement



RUN1 : Résurgence de colorant dans RUN1 lors des essais sur les installations eaux usées de l'appartement



N° Dossier :

E.24.401

JW / NV

Nombre de pages : 3

**OBJECTIF : Contrôle du raccordement et établissement d'un rapport**



**CLIENT :**

**MAIRIE**

Propriétaire :

MAIRIE

Interlocuteur sur site :

-

Adresse :

16 RUE DE LA SALLE

VILLE :

SAINT GERMAIN EN LAYE

TYPE DE BIEN :

APPARTEMENT : 3ème Lot 4

Réseau de collecte :

UNITAIRE

Date du contrôle : 09/02/2024

**Détail des essais réalisés**

**Raccordé au réseau public**

**Autre**

**Evacuation  
indéterminée**

**Installation testée**

**Moyen**

eaux usées

eaux  
pluviales

unitaire

Cuisine (3ème) [Evier/Lave-linge]

Colorant

X

Salle d'eau (3ème) [Douche/Lavabo/WC]

Colorant

X

**RESULTATS**

**EAUX USEES testées RACCORDEES au  
réseau d'eaux unitaire :**

Oui

**RESPECT DE LA  
SEPARATIVITE jusqu'en  
limite de propriété :**

**Non testé sur  
les  
appartements**

Observations :

Rédigé le :

14/02/2024

Vérfifié le :

Visa : N.VAZ

Visa :

*Il n'appartient pas à la société EAV de statuer sur la conformité des installations contrôlées. La société EAV ne se tient pas pour responsable du raccordement des installations (WC, cuisine, salle de bains, éviers et autres ...) non présentées lors du contrôle.*

*Les informations présentes dans ce rapport sont strictement confidentielles et demeurent la propriété du client.*

*Ce document ne peut être reproduit sans l'accord de EAV et du client.*

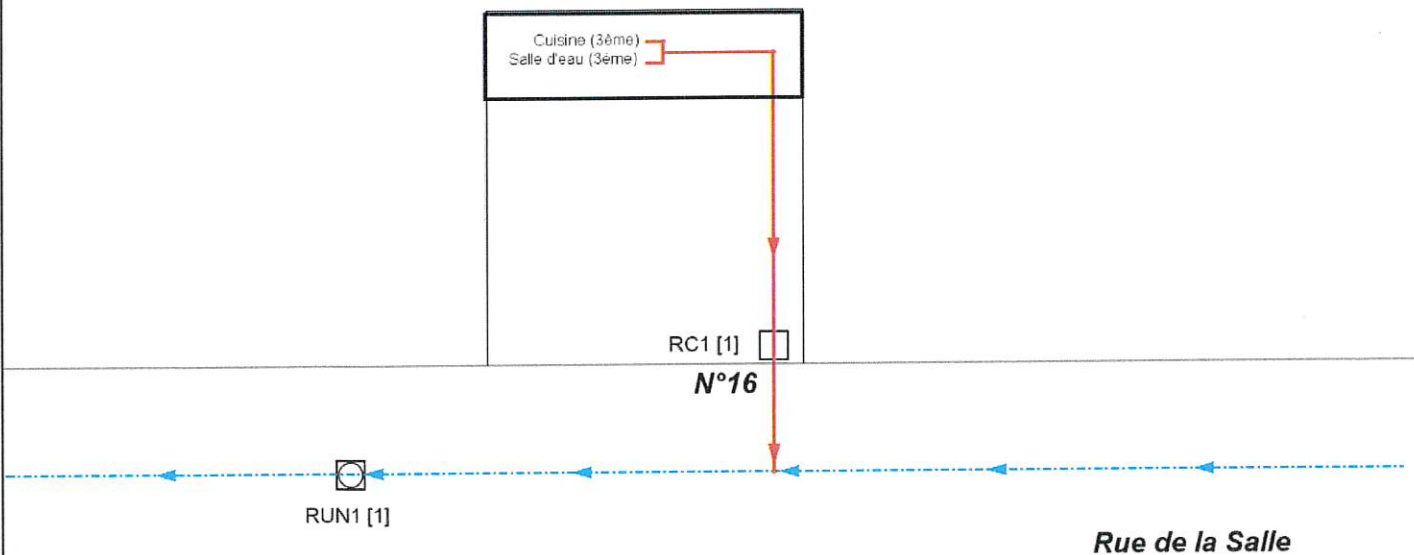


Schéma sans échelle  
Le tracé des réseaux est supposé

Légende

— Réseau Eaux Usées  
- - - Réseau Unitaire

□ RUNx - Regard Unitaire  
□ RCx - Regard de contrôle

➔ Sens d'écoulement  
[x] Nombre de photos prises





Client :

**MAIRIE**

Adresse :

16 RUE DE LA SALLE

Ville :

SAINTE GERMAIN EN LAYE

Opérateur : **JW**

Réseau : **UNITAIRE**

Page n°3 / 3

Date : **09/02/2024**

Dossier n° **E.24.401**

### PHOTOS ET OBSERVATIONS



RC1 : Résurgence de colorant dans RC1 lors des essais sur les installations eaux usées de l'appartement



RUN1 : Résurgence de colorant dans RUN1 lors des essais sur les installations eaux usées de l'appartement

